

Управление образования администрации  
Старооскольского городского округа Белгородской области

## **ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**


Директор муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования «Центр дополнительного  
образования «Одаренность»  
**Попогребская Ирина Валерьевна**

г. Старый Оскол, 2016 год

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

## (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

---

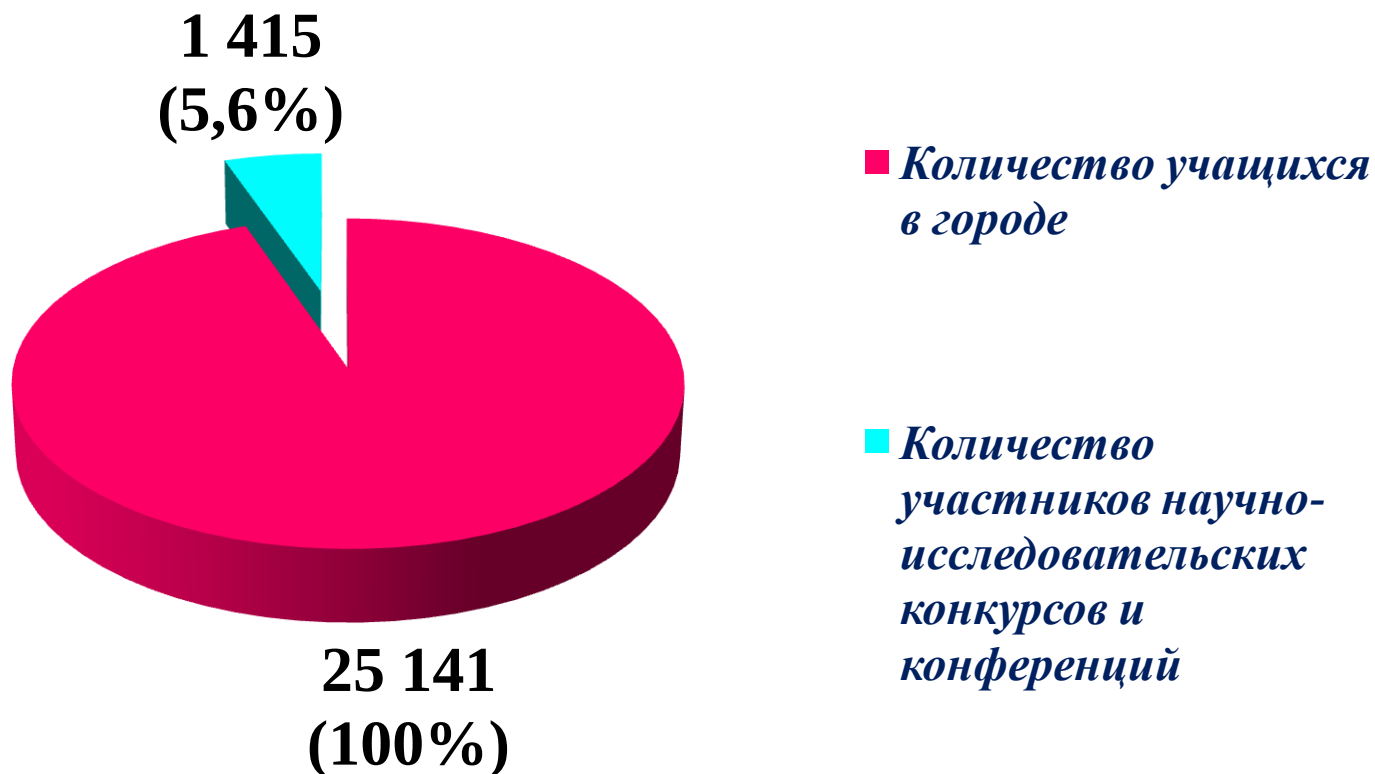

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

- НОО МБОУ «ОК «Лицей №3» «Эврика» - 63 человек;
- НОО МБОУ «СОШ №5 с УИОП» «Эрудит» - 507 человек;
- НОО МБОУ «ООШ №6» «Потенциал» - 15 человек;
- НОО МБОУ «ООШ №8» «Мыслитель» - 15 человек;
- НОО МБОУ «СОШ № 11» «Ивушка» - 30 человек;
- НОО МБОУ «СОШ №12 с УИОП» «Эрудит» - 20 человек;
- НОО МБОУ «СОШ №14» имени А.М.Мамонова «Эврика» - 73 человек, «Эрудит» - 358 человека;
- НОО МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» «Познание» - 35 человек;
- НОО МБОУ «Гимназия № 18» «Импульс» - 34 человека;
- НОО МБОУ «СШ № 19 – корпус-кадет «Виктория» «Сыны Отечества» - 355 человек;
- НОО МБОУ «СОШ № 20 с УИОП» «ХИМИНФО» - 15 человек;
- НОО МБОУ «СОШ №21» «Эрудит» - 62 человека;
- НОО МАОУ «СОШ №24 с УИОП» «Земляне» - 470 человек;
- НОО МБОУ «СОШ № 27 с УИОП» «ШАГ» - 332 человека;
- НОО МБОУ «СОШ № 28 с УИОП имени А.А.Угарова» «Эрудит» - 50 человек;
- НОО МБОУ «СОШ №30» «ШКИД» - 128 человек;
- НОО МАОУ «СПШ №33» «Наукоград» - 55 человек;
- НОО МБОУ «СОШ №34 с УИОП» «Поиск» - 271 человек;
- НОО МБОУ «ООШ № 36» «Созвездие» - 55 человек;
- НОО ЧОУ «Православная гимназия №38» «Облик» - 64 человек;
- НОО МАОУ «СОШ №40» «Эрудит» - 36 человек;
- НОО МБОУ «Городищенская СОШ с УИОП» «Интеллект» - 77 человек;
- НОО МБОУ «Каплинская ООШ» «Биотоп» - 67 человек;
- НОО МБОУ «Песчанская ООШ» «Возрождение» - 13 человек;
- НОО МБОУ «Роговатовская СОШ с УИОП» «Поиск» - 16 человек;
- НОО МБОУ «Шаталовская ООШ» «Родник» - 27 человек;
- НОО МБОУ «Ивановская ООШ» «Юный фермер» 1 человек.

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель проекта:            | Вовлечение к 28.04.2017 года не менее 50% участников школьных научных обществ 7 – 11 классов образовательных организаций Старооскольского городского округа с использованием ресурсов дополнительного образования в активную научно-исследовательскую деятельность на территории Старооскольского городского округа |
| Способ достижения цели:  | Разработка и апробация механизмов создания муниципального научного общества учащихся на территории Старооскольского городского округа                                                                                                                                                                               |
| Результат проекта        | Организована работа муниципального научного общества учащихся Старооскольского городского округа с пропускной способностью не менее 50% участников школьных научных обществ 7-11 классов к 28.04.2017 года                                                                                                          |
| Требования к результату: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

---

|                                  |                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Требования к результату:         |                                                                                                                              |
| Пользователи результата проекта: | Участники школьных научных обществ и педагогические работники образовательных организаций Старооскольского городского округа |

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| №     | Наименование                                                                                                                             | Длительность,<br>дней | Начало   | Окончание | 2016 год |    |    |    |    | 2017 год |    |    |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|
|       |                                                                                                                                          |                       |          |           | 08       | 09 | 10 | 11 | 12 | 01       | 02 | 03 | 04 |
| 1.    | <b>Формирование нормативно-правовой базы</b>                                                                                             | 18                    | 01.08.16 | 24.08.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 1.1.  | Разработка Положения о муниципальном научном обществе учащихся Старооскольского городского округа                                        | 3                     | 01.08.16 | 03.08.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 1.1.1 | Разработка организационной модели о муниципального научного общества учащихся                                                            | 2                     | 04.08.16 | 05.08.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 1.2.  | Разработка перечня мероприятий по реализации проекта                                                                                     | 2                     | 08.08.16 | 09.08.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 1.3.  | Разработка Программы постоянно-действующего семинара для педагогических работников – участников проекта                                  | 3                     | 10.08.16 | 12.08.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 1.4.  | Согласование нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность муниципального научного общества учащихся                   | 7                     | 15.08.16 | 24.08.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 2.    | <b>Информирование образовательных учреждений Старооскольского городского округа о создании муниципального научного общества учащихся</b> | 7                     | 25.08.16 | 02.09.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |

<sup>2</sup> завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| №    | Наименование                                                                                                           | Длительность,<br>дней | Начало   | Окончание | 2016 год |    |    |    |    | 2017 год |    |    |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|
|      |                                                                                                                        |                       |          |           | 08       | 09 | 10 | 11 | 12 | 01       | 02 | 03 | 04 |
| 2.1. | Разработка формы представления статистической информации о состоянии деятельности школьного научного общества учащихся | 2                     | 25.08.16 | 26.08.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 2.2. | Сбор и обработка статистической информации о состоянии деятельности школьного научного общества учащихся               | 3                     | 27.08.16 | 31.08.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 2.3  | Создание тематической вкладки...                                                                                       | 2                     | 01.09.16 | 02.09.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 3    | <b>Заключение соглашений с образовательными организациями и организациями высшего профессионального образования</b>    | 10                    | 05.09.16 | 16.09.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 3.1  | Определение базовых организаций                                                                                        | 2                     | 05.09.16 | 06.09.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 3.2. | Разработка типовых соглашений по вопросам реализации проекта                                                           | 3                     | 07.09.16 | 09.09.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 3.3. | Заключение соглашений                                                                                                  | 5                     | 12.09.16 | 16.09.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |

<sup>2</sup> завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом



# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| №    | Наименование                                                                                                                                                                                               | Длительность,<br>дней | Начало          | Окончание       | 2016 год |    |    |    |    | 2017 год |    |    |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|
|      |                                                                                                                                                                                                            |                       |                 |                 | 08       | 09 | 10 | 11 | 12 | 01       | 02 | 03 | 04 |
| 4.   | <b>Формирование Совета муниципального научного общества учащихся</b>                                                                                                                                       | <b>13</b>             | <b>19.09.16</b> | <b>05.10.16</b> |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 4.1. | Организация совещаний с руководителями школьных научных обществ учащихся по вопросу формирования муниципального научного общества учащихся                                                                 | 1                     | 19.09.16        | 19.09.16        |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 4.2. | Проведение мероприятий в школьных научных обществах учащихся по формированию состава представителей в муниципальное научное общество учащихся                                                              | 2                     | 20.09.16        | 21.09.16        |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 4.3. | Организационный сбор представителей в школьных научных обществ учащихся                                                                                                                                    | 1                     | 22.09.16        | 22.09.16        |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 4.4. | Формирование состава кафедр муниципального научного общества учащихся                                                                                                                                      | 1                     | 23.09.16        | 23.09.16        |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 4.5. | Формирование Научного Совета муниципального научного общества учащихся                                                                                                                                     | 1                     | 26.09.16        | 26.09.16        |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 4.6. | Проведение заседания муниципального методического объединения руководителей школьных научных обществ учащихся по вопросу формирования состава экспертного совета муниципального научного общества учащихся | 1                     | 27.09.16        | 27.09.16        |          |    |    |    |    |          |    |    |    |

2 ~~завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом~~

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| №    | Наименование                                                                                                                    | Длительность, дней | Начало          | Окончание       | 2016 год |    |    |    |    | 2017 год |    |    |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|
|      |                                                                                                                                 |                    |                 |                 | 08       | 09 | 10 | 11 | 12 | 01       | 02 | 03 | 04 |
| 4.7. | Формирование экспертного совета муниципального научного общества учащихся                                                       | 2                  | 28.09.16        | 29.09.16        |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 4.8. | Формирование состава экспертного совета муниципального научного общества учащихся                                               | 3                  | 30.09.16        | 04.10.16        |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 4.9. | Организация заседания Совета муниципального научного общества учащихся                                                          | 1                  | 05.10.16        | 05.10.16        |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 5.   | <b>Организация проведения I сессии постоянно-действующего семинара для участников муниципального научного общества учащихся</b> | <b>11</b>          | <b>06.10.16</b> | <b>21.10.16</b> |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 5.1. | Разработка плана проведения I сессии постоянно-действующего семинара для участников муниципального научного общества учащихся   | 3                  | 07.10.16        | 11.10.16        |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 5.2. | Проведение индивидуальных и групповых консультаций для участников постоянно-действующего семинара                               | 3                  | 12.10.16        | 14.10.16        |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 5.3. | Подготовка методического и технического оснащения для проведения постоянно-действующего семинара                                | 4                  | 17.10.16        | 20.10..16       |          |    |    |    |    |          |    |    |    |

<sup>2</sup> завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| №    | Наименование                                                                                                                          | Длительность,<br>дней | Начало   | Окончание | 2016 год |    |    |    |    | 2017 год |    |    |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|
|      |                                                                                                                                       |                       |          |           | 08       | 09 | 10 | 11 | 12 | 01       | 02 | 03 | 04 |
| 5.4. | Проведение I сессии постоянно-действующего семинара                                                                                   | 1                     | 21.10.16 | 21.10.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 6.   | <b>Организация и проведение мастер-классов для участников муниципального этапа всероссийских научно-исследовательских конференций</b> | 17                    | 24.10.16 | 16.11.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 6.1. | Разработка плана проведения мастер-классов                                                                                            | 3                     | 24.10.16 | 26.10.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 6.2. | Проведение индивидуальных консультаций для участников мастер-классов                                                                  | 6                     | 27.10.16 | 03.11.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 6.3. | Подготовка методического и технологического оснащения                                                                                 | 6                     | 07.11.16 | 14.11.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 6.4. | Проведение мастер классов                                                                                                             | 2                     | 15.11.16 | 16.11.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 7.   | Создание электронной газеты муниципального научного общества учащихся                                                                 | 18                    | 17.11.16 | 12.12.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |

<sup>2</sup> завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| №    | Наименование                                                                                                                                                           | Длительность,<br>дней | Начало   | Окончание | 2016 год |    |    |    |    | 2017 год |    |    |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|
|      |                                                                                                                                                                        |                       |          |           | 08       | 09 | 10 | 11 | 12 | 01       | 02 | 03 | 04 |
| 7.1. | Формирование творческой группы по созданию электронной газеты                                                                                                          | 2                     | 17.11.16 | 18.11.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 7.2. | Проведение практикума по созданию электронной газеты                                                                                                                   | 2                     | 21.11.16 | 22.11.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 7.3. | Разработка макета электронной газеты муниципального научного общества учащихся                                                                                         | 4                     | 23.11.16 | 28.11.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 7.4. | Сбор материалов для электронной газеты муниципального научного общества учащихся                                                                                       | 6                     | 29.11.16 | 06.12.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 7.5. | Оформление электронной газеты муниципального научного общества учащихся                                                                                                | 2                     | 07.12.16 | 08.12.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 7.6  | Размещение электронной газеты во вкладке «Муниципальное научное общество учащихся» на официальном сайте образовательной организации в разделе «Проектная деятельность» | 2                     | 09.12.16 | 12.12.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 8.   | Организация проведения II сессии постоянно действующего семинара                                                                                                       | 13                    | 13.12.16 | 29.12.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 8.1. | Разработка плана проведения II сессии постоянно действующего семинара                                                                                                  | 4                     | 13.12.16 | 16.12.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |

<sup>2</sup> завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| №    | Наименование                                                                                      | Длительность,<br>дней | Начало   | Окончание | 2016 год |    |    |    |    | 2017 год |    |    |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|
|      |                                                                                                   |                       |          |           | 08       | 09 | 10 | 11 | 12 | 01       | 02 | 03 | 04 |
| 8.2. | Проведение индивидуальных и групповых консультаций для участников постоянно действующего семинара | 4                     | 19.12.16 | 23.12.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 8.3. | Подготовка методического и технологического оснащения для постоянно действующего семинара         | 3                     | 26.12.16 | 28.12.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 8.4. | Проведение II сессии постоянно действующего семинара                                              | 1                     | 29.12.16 | 29.12.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 9.   | Организация и проведение заседания Научного Совета МНОУ                                           | 5                     | 30.12.16 | 13.01.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 9.1. | Разработка и утверждение программы заседания Научного Совета МНОУ                                 | 1                     | 30.12.16 | 30.12.16  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 9.2. | Информирование членов Научного Совета МНОУ о заседании                                            | 1                     | 10.01.17 | 10.01.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 9.3. | Подготовка материалов для проведения заседания Научного Совета МНОУ                               | 2                     | 11.01.17 | 12.01.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 9.4. | Проведение заседания Научного Совета МНОУ                                                         | 1                     | 13.01.17 | 13.01.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |

<sup>2</sup> завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| №     | Наименование                                                                                      | Длительность,<br>дней | Начало   | Окончание | 2016 год |    |    |    |    | 2017 год |    |    |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|
|       |                                                                                                   |                       |          |           | 08       | 09 | 10 | 11 | 12 | 01       | 02 | 03 | 04 |
| 10.   | Организация и проведение волонтерской акции «Мы – исследователи»                                  | 35                    | 16.01.17 | 06.03.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 10.1. | Разработка Положения о проведении волонтерской акции «Мы – исследователи»                         | 6                     | 16.01.17 | 23.01.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 10.2. | Формирование состава волонтерских групп в образовательных организациях                            | 6                     | 24.01.17 | 31.01.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 10.3. | Практикум для участников волонтерских групп                                                       | 4                     | 01.02.17 | 06.02.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 10.4. | Проведение волонтерской акции «Мы – исследователи»                                                | 19                    | 07.02.17 | 06.03.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 11.   | Организация проведения II сессии постоянно действующего семинара                                  | 10                    | 07.03.17 | 21.03.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 11.1. | Разработка плана проведения II сессии постоянно действующего семинара                             | 3                     | 07.03.17 | 10.03.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 11.2. | Проведение индивидуальных и групповых консультаций для участников постоянно действующего семинара | 2                     | 13.03.17 | 14.03.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |

<sup>2</sup> завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| №     | Наименование                                                                              | Длительность,<br>дней | Начало   | Окончание | 2016 год |    |    |    |    | 2017 год |    |    |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|
|       |                                                                                           |                       |          |           | 08       | 09 | 10 | 11 | 12 | 01       | 02 | 03 | 04 |
| 11.3. | Подготовка методического и технологического оснащения для постоянно действующего семинара | 4                     | 15.03.17 | 20.03.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 11.4. | Проведение II сессии постоянно действующего семинара                                      | 1                     | 21.03.17 | 21.03.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 12.   | Организация проведения Форума юных исследователей                                         | 12                    | 22.03.17 | 06.04.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 12.1. | Разработка Положения о Форуме юных исследователей                                         | 3                     | 22.03.17 | 24.03.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 12.2. | Разработка плана проведения Форума юных исследователей                                    | 4                     | 27.03.17 | 30.03.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 12.3. | Проведение индивидуальных и групповых консультаций для участников Форума                  | 2                     | 31.03.17 | 03.04.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 12.4. | Проведение Форума юных исследователей                                                     | 3                     | 04.04.17 | 06.04.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 13.   | Организация и проведение заседания Совета МНОУ                                            | 7                     | 07.04.17 | 28.04.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |

<sup>2</sup> завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| №     | Наименование                                                                             | Длительность,<br>дней | Начало   | Окончание | 2016 год |    |    |    |    | 2017 год |    |    |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|
|       |                                                                                          |                       |          |           | 08       | 09 | 10 | 11 | 12 | 01       | 02 | 03 | 04 |
| 13.1  | Разработка и утверждение программы проведения заседания Совета МНОУ                      | 2                     | 07.04.17 | 10.04.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 13.2. | Информирование членов Совета МНОУ о проведении заседания                                 | 1                     | 11.04.17 | 11.04.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 13.3. | Подготовка материалов для проведения заседания                                           | 3                     | 12.04.17 | 14.04.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 13.4. | Проведение заседания Совета МНОУ                                                         | 1                     | 17.04.17 | 17.04.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 14.   | Подведение итогов проекта                                                                | 9                     | 18.04.17 | 28.04.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 14.1. | Разработка пакета документов для проведения мониторинга эффективности реализации проекта | 3                     | 18.04.17 | 20.04.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 14.2. | Проведение мониторинга эффективности реализации проекта                                  | 3                     | 21.04.17 | 25.04.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 14.3. | Подготовка итогового отчета о реализации проекта                                         | 2                     | 26.04.17 | 27.04.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |
| 14.4. | Презентация проекта                                                                      | 1                     | 28.04.17 | 28.04.17  |          |    |    |    |    |          |    |    |    |

<sup>2</sup> завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)




**Кафедры:**

- - естественно-научная
- - гуманитарная
- - эколого-биологическая

- - краеведческая
- - техническая

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

---

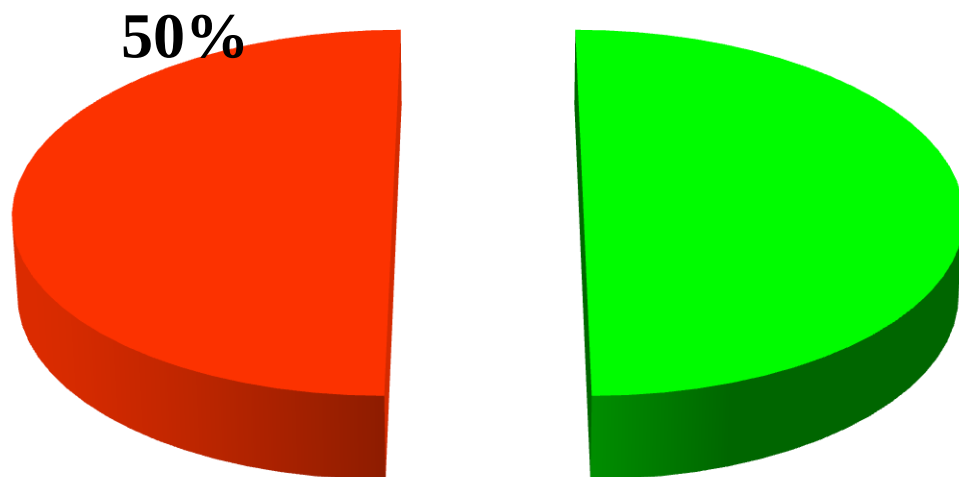

■ 3230 - количество участников в школьных научных обществах

■ 1615 - количество членов школьных научных обществ, участвующих в научно-исследовательских мероприятиях

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

## *Мотивация активных участников МНОУ*



# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |           |         | Внебюджетные источники |                   |        |
|---|--------------|---------------------------|---------------------|-----------|---------|------------------------|-------------------|--------|
|   |              |                           | федеральный         | областной | местный | средства хоз. субъекта | заем-ные средства | прочие |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |           |         | Внебюджетные источники |                   |        |
|---|--------------|---------------------------|---------------------|-----------|---------|------------------------|-------------------|--------|
|   |              |                           | федеральный         | областной | местный | средства хоз. субъекта | заем-ные средства | прочие |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |
|   |              | 0                         | 0                   | 0         | 0       | 0                      | 0                 | 0      |

# ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| Бюджетное финансирование                                                                                                                           |                                   |                                   |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|
| Форма участия                                                                                                                                      |                                   | Размер участия бюджета, тыс. руб. |           |         |
|                                                                                                                                                    |                                   | Федеральный                       | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование                                                                                                                    | Указать соответствующую программу |                                   |           |         |
| Дороги <sup>13</sup>                                                                                                                               | Указать плановую протяженность    |                                   |           |         |
| Субсидии <sup>13</sup>                                                                                                                             | Указать соответствующую программу |                                   |           |         |
| ИТОГО:                                                                                                                                             |                                   |                                   |           |         |
| Программы государственной поддержки                                                                                                                |                                   |                                   |           |         |
| Потребность                                                                                                                                        |                                   | Финансовые вложения, тыс. руб.    |           |         |
| Электроэнергия <sup>13</sup>                                                                                                                       | Указать требуемую мощность        |                                   |           |         |
| Газоснабжение <sup>13</sup>                                                                                                                        | Указать требуемый объем           |                                   |           |         |
| Водоснабжение <sup>13</sup>                                                                                                                        | Указать требуемый объем           |                                   |           |         |
| Гарантии <sup>13</sup>                                                                                                                             |                                   |                                   |           |         |
| Залоги <sup>13</sup>                                                                                                                               |                                   |                                   |           |         |
| Прочие формы участия <sup>13</sup> :                                                                                                               |                                   |                                   |           |         |
| Земельный участок: указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка |                                   |                                   |           |         |

<sup>13</sup> необходимо указать основание выделения денежных средств

# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

|          |                                                                  |           |     |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| <b>1</b> | <b>Социальная эффективность</b>                                  |           |     |
| 1.1      | Охват населения социальными благами за период реализации проекта | Тыс. чел. | 0,3 |
| 1.2      | Новые рабочие места                                              | Ед.       | 0   |
| 1.3      | Средняя з/п                                                      | Тыс. руб. | 0   |
| 1.4      | Месячный ФОТ                                                     | Млн. руб. | 0   |
| 1.5      | Годовой ФОТ                                                      | Млн. руб. | 0   |
| 1.6      | Иные показатели                                                  |           | 0   |
| <b>2</b> | <b>Бюджетная эффективность</b>                                   |           |     |
| 2.1      | Участие бюджетных источников в проекте                           | Млн. руб. | 0   |
| 2.2      | Налоги в консолидированный бюджет области                        | Руб.      | 0   |
| 2.3      | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области           | Млн. руб. | 0   |
| 2.4      | Целевая выработка на одного работника                            | Млн. руб. | 0   |
| 2.5      | Срок окупаемости бюджетных инвестиций                            | Лет       | 0   |
| 2.6      | Снижение возможного ущерба                                       | Млн. руб. | 0   |
| 2.7      | Экономия бюджетных средств                                       | Млн. руб. | 0   |
| <b>3</b> | <b>Экономическая эффективность</b>                               |           |     |
| 3.1      | Годовой объем выручки <sup>13</sup>                              | Млн. руб. | 0   |
| 3.2      | Годовой объем прибыли <sup>13</sup>                              | Млн. руб. | 0   |
| 3.3      | Рентабельность <sup>13</sup>                                     | %         | 0   |
| 3.4      | Срок окупаемости проекта                                         | Лет       | 0   |
| 3.5      | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта             | Млн. руб. | 0   |
| 3.6      | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области              | Млн. руб. | 0   |
| 3.7      | Иные показатели                                                  |           |     |

<sup>13</sup> после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

# КОМАНДА ПРОЕКТА

| №  | ФИО                           | Должность и основное место работы                                                | Выполняемые в проекте работы |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Ушакова Ирина Геннадьевна     | заместитель начальника управления образования Старооскольского городского округа | Куратор проекта              |
| 2. | Попогребская Ирина Валерьевна | директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»                 | Руководитель проекта         |
| 3. | Котарева Наталья Ивановна     | методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»                 | Администратор проекта        |
| 4. | Ковальчук Ольга Александровна | ведущий специалист управления образования Старооскольского городского округа     | Оператор мониторинга         |
| 5. | Хлебникова Елена Ильинична    | методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования»                 | исполнитель                  |
| 6. | Ровенских Марина Анатольевна  | заместитель директора МБОУ «ОК «Лицей №3»                                        | исполнитель                  |
| 7. | Исонова Наталия Валерьевна    | заместитель директора МБОУ «СОШ №14» им. А.М. Мамонова                           | исполнитель                  |



# КОМАНДА ПРОЕКТА

| №   | ФИО                                 | Должность и основное место работы                                                                                                                                         | Выполняемые в проекте работы |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 8.  | <b>Лященко Ольга Петровна</b>       | заместитель директора МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов»                                                                                          | исполнитель                  |
| 9.  | <b>Горгола Оксана Анатольевна</b>   | учитель английского языка МБОУ «СОШ №16 с углубленным изучением отдельных предметов»                                                                                      | исполнитель                  |
| 10. | <b>Кононова Галина Владимировна</b> | учитель биологии МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов», руководитель муниципального методического объединения руководителей школьных научных обществ | исполнитель                  |
| 11. | <b>Никитин Александр Николаевич</b> | учитель физики МБОУ «СОШ №27 с углубленным изучением отдельных предметов»                                                                                                 | исполнитель                  |
| 12. | <b>Боровенская Ирина Юрьевна</b>    | заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»                                                                                             | исполнитель                  |
| 13  | <b>Косинова Анастасия Павловна</b>  | электроник МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»                                                                                                        | исполнитель                  |

# КОМАНДА ПРОЕКТА

| №   | ФИО                       | Должность и основное место работы                                                           | Выполняемые в проекте работы |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 14. | Косухина Ирина Викторовна | методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»                            | исполнитель                  |
| 15. | Степанова Вера Васильевна | педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» | исполнитель                  |

## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

---

Руководитель проекта:

*Попогребская Ирина Валерьевна*

тел.: (4725) 22-05-47

e-mail: [crtdu\\_2@mail.ru](mailto:crtdu_2@mail.ru)
